


真岡市公共施設等総合管理計画の進捗状況

平成28年度に策定した「真岡市公共施設等総合管理計画（平成29年3月）」の進捗状況について、「建築物系公共施設」と「インフラ系公共施設」に分けて、令和元年度（平成31年度）末時点の進捗状況を整理します。

図1 真岡市公共施設等総合管理計画の対象施設

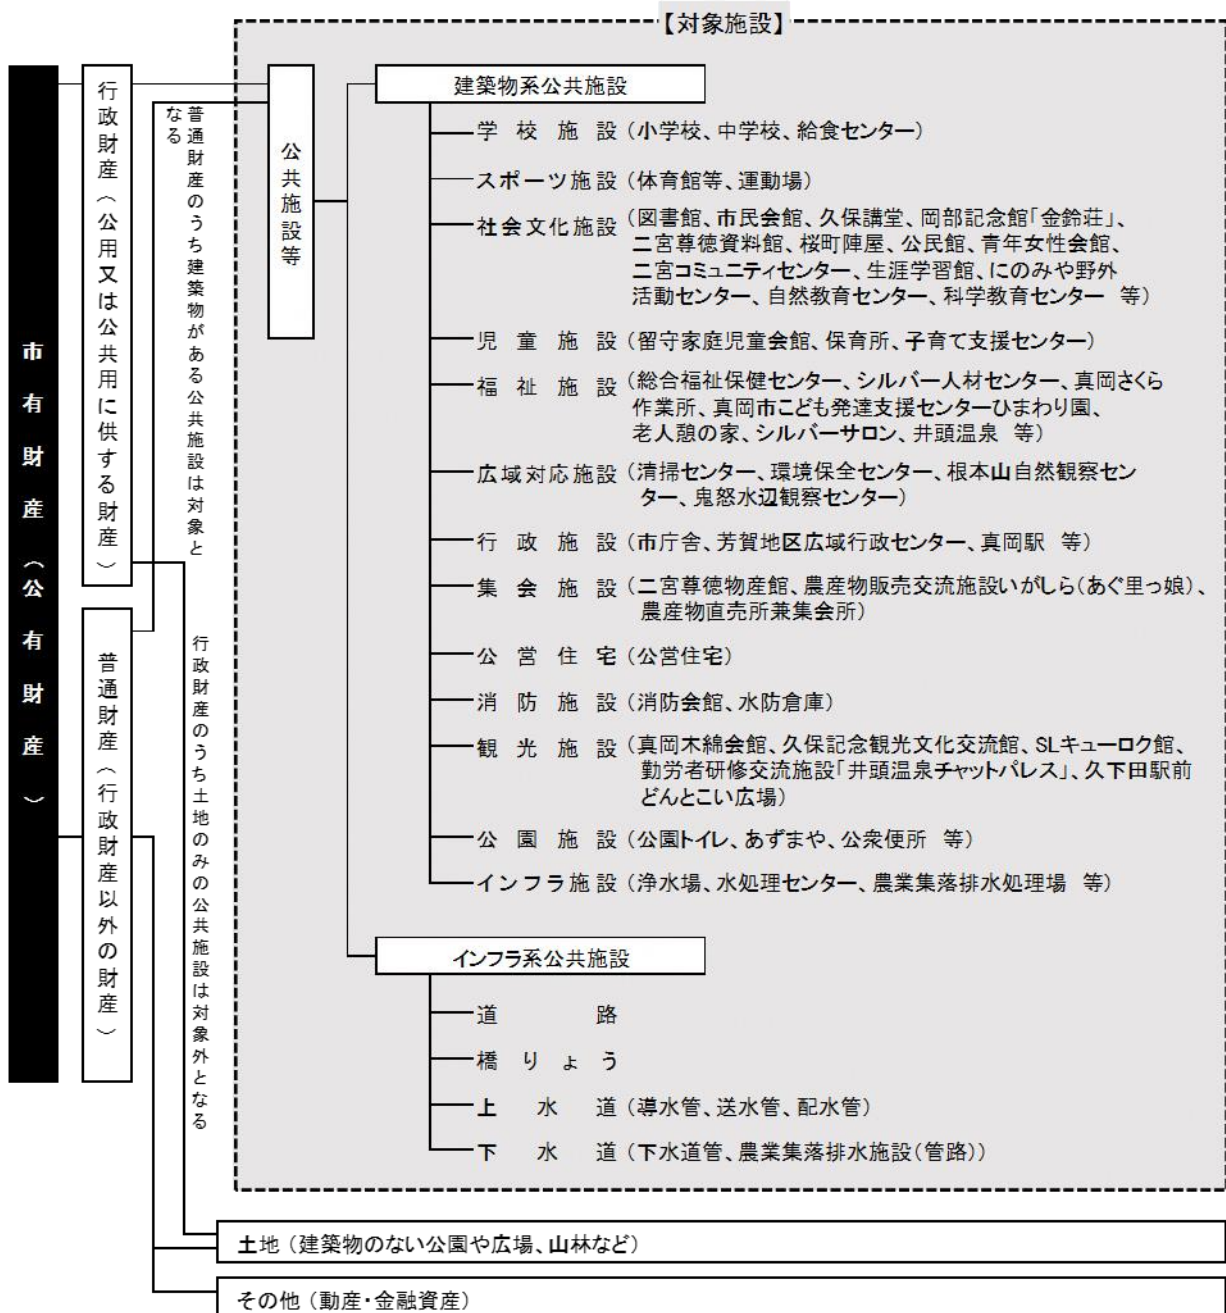

1. 建築物系公共施設（真岡市公共施設再配置計画）の進捗について

建築物系公共施設については、実施計画にあたる「真岡市公共施設再配置計画」を平成 29 年度に策定し、各施設の効率的な維持管理・運営や建替え、再配置等に取り組んでいます。

数値目標 40 年間で建築物系公共施設の総延床面積を 25.5%縮減
延床面積 29.8 万㎡→22.2 万㎡（約 7.6 万㎡縮減）

1-1. 延床面積および将来更新等費用の縮減効果

令和元年度の各施設の取組による延床面積および将来更新等費用の縮減効果は、下記のとおりです。

総延床面積は、平成 29 年 10 月時点の約 29.6 万㎡から約 0.3 万㎡増加し、令和 2 年 3 月末（令和元年度末）時点で約 29.8 万㎡になっています。

また、すべての施設を現状のまま維持する場合の今後 40 年間（平成 29～68 年度）の将来更新等費用 1,272.5 億円（※真岡市公共施設等総合管理計画の試算結果）は、令和元年度までの取組により約 42.8 億円減少して 1,229.6 億円になると試算されます。

表 1 真岡市公共施設再配置計画の目標に対する現在の状況

時期	公共施設再配置計画 策定	現在の状況	10年後の目標 公共施設再配置計画 (第 1 ステージ後)
	平成29年10月 (2017年10月)	令和2年3月末 (2020年3月末)	令和9年3月末 (2027年3月末)
延床面積	29.6万㎡ (295,560㎡)	29.8万㎡ (298,320㎡)	28.9万㎡
増減	—	0.2万㎡ (2,760㎡)	▲0.7万㎡ (▲2.2%)
将来更新等費用推計 (大規模修繕・建替え)	1,272.5億円	1,229.6億円	1,143.5億円
増減	—	▲42.8億円 (▲42億8,396万円)	▲129.0億円 (▲10.1%)
維持管理・運営面の 効果額	—	0.0億円	▲0.2億円

※将来更新等費用は、公共施設等総合管理計画の計画期間 40 年間(平成 29 年度～平成 68 年度)の合計金額。

※将来更新等費用は「公共施設等更新費用試算ソフト（一般財団法人地域総合整備財団）」の試算条件を使用して試算しています。基本的な試算条件は以下のとおりです。

- ・各施設の建替え費 = 建替え単価（千円/㎡）×延床面積（㎡）
- ・各施設の大規模修繕費 = 大規模修繕単価（千円/㎡）×延床面積（㎡）
- ・建て替え時期：築 60 年目、大規模修繕時期：築 30 年目

※今後整備を予定している新庁舎や新庁舎周辺整備事業等、R2.7 に竣工した新庁舎等の延床面積や建設費は考慮していません。

※維持管理・運営面の効果額は、指定管理者制度の導入や民営化等で得られる維持管理・運営費の削減額を追加していきます。（※令和元年度までは実績がないため効果額は出ていません。）

※延床面積及び増減の面積は、四捨五入をしているため、計算上数値が一致しない部分があります。

表2 施設類型別の建築物系公共施設の延床面積（再配置計画策定時（H29.10月）からの増減）

(㎡)

施設類型		H29年 10月 時点	R01 年度末 時点	増減（当初比）		増減内訳			
大分類	中分類			増減量	増減率	減少量	減少の主な要因	増加量	増加の主な要因
学校施設	小学校	85,929	77,304	▲8,625	▲10.0%	▲11,876	山前南小、東沼小、中村東小、中村南小：廃校	3,251	山前小：増築、建替 中村小：校舎増築 長田小：保健室棟の増築
	中学校	62,086	62,086	0	0.0%	0		0	
	給食センター	3,380	3,380	0	0.0%	0		0	
スポーツ施設	体育館等	15,966	15,734	▲232	▲1.5%	▲232	弓道場：除却 二宮弓道場：除却	0	
	運動公園・運動場	995	2,784	1,790	179.9%	0		1,790	総合運動公園：管理棟等の新設
社会文化施設	図書館・記念館・資料館等	10,269	10,269	0	0.0%	0		0	
	公民館・コミュニティセンター等	17,854	17,854	0	0.0%	0		0	
	教育センター	7,724	7,724	0	0.0%	0		0	
児童施設	児童館	606	606	0	0.0%	0		0	
	保育所	2,589	2,589	0	0.0%	0		0	
	子育て支援センター	808	2,221	1,412	174.7%	▲35	第一子育て支援センター：延床面積の修正	1,448	情報センター：真岡子ども広場（子育て支援センター）としてリニューアル
福祉施設	福祉施設等	4,087	3,576	▲511	▲12.5%	▲516	老人憩いの家：除却	5	真岡さくら作業所：延床面積の修正
	健康増進施設	5,398	5,596	197	3.7%	0		197	休日夜間急患診療所：新設等
広域対応施設（環境施設）	広域対応施設等	5,276	2,524	▲2,752	▲52.2%	▲5,178	清掃センター：除却、倉庫等をリサイクルセンターに移管	2,426	リサイクルセンター：新設
	自然観察センター	781	781	0	0.0%	0		0	
行政施設	市庁舎	7,343	6,904	▲439	▲6.0%	▲439	本庁舎：一部除却 西合同庁舎：除却	0	
	その他行政施設	8,681	19,674	10,993	126.6%	▲1,448	情報センター：真岡子ども広場（子育て支援センター）としてリニューアル	12,441	廃校4施設を移管 市長車等車庫棟：新設 文書保存倉庫：譲受（416㎡）
集会施設	物産館・集会施設等	934	1,865	930	99.6%	▲275	二宮尊徳物産館：解体	1,205	二宮尊徳物産館：建替え（805㎡） 久下田どんとこい広場：観光施設から区分変更（400㎡）
公営住宅	公営住宅等	32,940	32,940	0	0.0%	0		0	
消防施設	消防施設等	1,946	1,946	0	0.0%	0		0	
観光施設	観光施設等	4,564	4,448	▲117	▲2.6%	▲400	久下田どんとこい広場：集会施設に区分変更	284	SLキューロク館：増築 真岡木綿会館：増築 久保記念観光文化交流館：カヒラス新設
インフラ施設	排水処理場等	11,129	11,129	0	0.0%	0		0	
	水道施設	2,346	2,346	0	0.0%	0		0	
公園施設	公園施設	1,928	2,042	113	5.9%	0		113	四阿等の新設等
合計		295,560	298,320	2,760	0.9%	▲20,400		23,160	

1-2. 令和元年度の主な取組結果および今後の予定

令和元年度の主な取組結果および今後の予定を施設分類別・地区別に整理すると下記のとおりです。（※各施設の再配置方針の進捗状況一覧は、資料2をご覧ください。）

図2 令和元年度の主な取組結果および今後の予定

施設類型		真岡地区	山前地区	大内地区	中村地区	二宮地区
大分類	中分類	37,858人	8,073人	6,500人	13,002人	15,200人
学校施設	小学校	10,795㎡ 真岡西小学校 9,235㎡ 真岡小学校 6,206㎡ 真岡東小学校 4,447㎡ 亀山小学校	4,948㎡ 山前小学校 4,068㎡ 西田井小学校	3,851㎡ 大内中央小学校 3,766㎡ 大内西小学校 3,366㎡ 大内東小学校	4,897㎡ 中村小学校 4,159㎡ 長田小学校	8,608㎡ 久下田小学校 4,977㎡ 物部小学校 3,981㎡ 長沼小学校
	中学校	12,003㎡ 真岡中学校 7,538㎡ 真岡西中学校 6,726㎡ 真岡東中学校	6,648㎡ 山前中学校	5,574㎡ 大内中学校	7,018㎡ 中村中学校	6,003㎡ 久下田中学校 5,655㎡ 物部中学校 4,921㎡ 長沼中学校
	給食センター	1,975㎡ 第1学校給食センター 移転・建替えを検討中 R2年度に建設候補地を決定予定				1,405㎡ 第2学校給食センター
スポーツ施設	体育館等	4,990㎡ スポーツ交流館 3,943㎡ 総合体育館 2,514㎡ 武道体育館 1,043㎡ 附属体育館 R2年度解体予定				1,680㎡ 二宮体育館 835㎡ 長沼地域体育館 728㎡ 物部地域体育館
	運動公園・運動場	庁舎周辺の複合施設に機能移転予定	2,369㎡ 総合運動公園 178㎡ 東運動場	60㎡ 北運動場		177㎡ 二宮運動場 尊徳資料館及び桜町陣屋の保存活用計画をR2・3年度に策定
社会文化施設	図書館・記念館・資料館等	4,239㎡ 市民会館 2,555㎡ 図書館 726㎡ 久保講堂 416㎡ 岡部記念館「金鈴荘」		396㎡ 大内資料館		1,496㎡ 真岡市歴史資料保存館 318㎡ 二宮尊徳資料館 124㎡ 桜町陣屋
	公民館・コミュニティセンター	1,410㎡ 青年女性会館(集会所) R2.4月～指定管理開始 1,255㎡ 公民館本館 R2.4月～指定管理開始 1,129㎡ 公民館真岡西分館	1,479㎡ 公民館山前分館	1,581㎡ 公民館大内分館	1,324㎡ 公民館中村分館	6,853㎡ 二宮コミュニティセンター(二宮支所、公民館二宮分館、二宮図書館を併設) 2,013㎡ 生涯学習館 383㎡ におみや野外活動センター 260㎡ 物部会館 167㎡ 長沼会館
	教育センター	3,544㎡ 科学教育センター			4,179㎡ 自然教育センター(老人研修センターを併設)	
児童施設	児童館	214㎡ 真岡東小学校留守家庭児童館 196㎡ 真岡西小学校留守家庭児童館 196㎡ 真岡小学校留守家庭児童館				
	保育所	1,024㎡ 真岡保育所 庁舎周辺の複合施設に機能移転予定 546㎡ 老人憩いの家 屋内子ども遊び場としてR2.1月リニューアルオープン R2.3月除却	246㎡ 西田井保育所	777㎡ 中村保育所	542㎡ 物部保育所 再配置基本計画作成予定	
	子育て支援センター	594㎡ 第1子育て支援センター 179㎡ 第2子育て支援センター 1,448㎡ 真岡駅子ども広場			児童発達支援センター化を検討予定	
福祉施設	福祉施設等	1,148㎡ 総合福祉センター 197㎡ 真岡市休日夜間急患診療所	240㎡ シルバー人材センター 172㎡ ヌルカ	516㎡ 老人憩いの家 R2.3月除却	1,243㎡ こども発達支援センター 238㎡ 真岡さくら作業所 ひまわり園	535㎡ 二宮保健センター
	健康増進施設			5,398㎡ 健康増進施設(真岡井頭温泉) リニューアルに向けた基本設計・実施設計予定		

図3 令和元年度の主な取組結果および今後の予定(続き)

施設類型		真岡地区 37,858人				山前地区 8,073人		大内地区 6,500人		中村地区 13,002人			二宮地区 15,200人																						
大分類	中分類																																		
広域対応施設 (環境施設)	広域対応施設等	新庁舎移転に伴い R3年度解体予定				R3年度解体予定					H31.4月に稼働開始																								
	自然観察センター	R2年度解体予定				R2年度解体予定																													
行政施設	市庁舎	5,466㎡ 本庁舎				731㎡ 建設部棟		707㎡ 教育委員会棟		リース期間満了に伴い 無償譲受			R2年度解体予定																						
	その他行政施設	4,448㎡ 情報センター				578㎡ 真岡駅		416㎡ 文書保存倉庫		404㎡ 水道庁舎		337㎡ 田町文化財倉庫		2,927㎡ 旧山前南小学校		2,709㎡ 旧東沼小学校		2,163㎡ 芳賀地区広域行政センター		3,270㎡ 旧中村東小学校		2,970㎡ 旧中村南小学校		2,467㎡ 旧長沼北小学校		835㎡ 旧長沼地域体育館		278㎡ 久下田駅(さくらホール)		143㎡ 真岡鐵道倉庫					
集会施設	物産館・集会施設等	214㎡ 田町東側倉庫				204㎡ 田町代外用資材倉庫		158㎡ シルバー西側事務所		149㎡ 市長車等車庫棟		123㎡ 田町業務員控室		91㎡ 西田井駅		113㎡ 農産物直売所兼集会所		546㎡ 農産物販売交流施設いがしら(あくりっ娘)		805㎡ 二宮尊徳物産		400㎡ 久下田駅前どんとこい広場													
公営住宅	公営住宅等	11,167㎡ 東郷市営住宅				3,796㎡ 大谷台市営住宅		2,447㎡ 高間木市営住宅		824㎡ 中丸市営住宅		市営住宅全般における指定管理者制度の導入について検討中						5,014㎡ 久松町市営住宅		3,840㎡ 錦町市営住宅		1,590㎡ さくら市営住宅													
消防施設	消防施設等	89㎡ 第1分団第5部消防会館				88㎡ 第1分団第4部消防会館		87㎡ 第1分団第2部消防会館		62㎡ 第1分団第3部消防会館		48㎡ 第1分団第1部消防会館		87㎡ 第2分団第1部消防会館		87㎡ 第2分団第2部消防会館		87㎡ 第3分団第1部消防会館		87㎡ 第3分団第2部消防会館		87㎡ 第4分団第1部消防会館		87㎡ 第4分団第2部消防会館		87㎡ 第4分団第3部消防会館		93㎡ 第6分団第3部消防会館		89㎡ 第5分団第2部消防会館		89㎡ 第7分団第3部消防会館		80㎡ 第5分団第1部消防会館	
		87㎡ 第2分団第3部消防会館				87㎡ 第3分団第3部消防会館		87㎡ 第7分団第2部消防会館		70㎡ 第6分団第2部消防会館		66㎡ 第7分団第1部消防会館		66㎡ 第6分団第1部消防会館		66㎡ 第6分団第4部消防会館		59㎡ 第5分団第3部消防会館		33㎡ 長沼地区水防倉庫															
観光施設	観光施設等	747㎡ 久保記念観光文化交流館				675㎡ SLキ-07館		457㎡ 真岡木綿会館		56㎡ お休み処もめん茶屋		屋内にイートインスペースを整備						見学・体験機能、販売強化		もめん茶屋利用者は金鈴荘で飲食できる特典をつけた取組を実施		2,512㎡ 勤労者研修交流施設「井頭温泉チャットパレス」		R1年度にストックマネジメント計画策定		400㎡ 久下田駅前どんとこい広場		物品の移転先を検討中							
インフラ施設	排水処理場等	432㎡ 東郷地区農業集落排水処理場				369㎡ 東大島地区農業集落排水処理場		228㎡ 両沼地区農業集落排水処理場		63㎡ 飯貝地区農業集落排水処理場		7,221㎡ 真岡市水処理センター		159㎡ 大沼地区農業集落排水処理場		132㎡ 粕田地区農業集落排水処理場		1,093㎡ 二宮水処理センター		376㎡ 鹿・物井地区農業集落排水処理場		365㎡ 二宮東部地区農業集落排水処理場		326㎡ 二宮地区農業集落排水処理場											
	水道施設	275㎡ 荒町配水場				194㎡ 大谷台配水場		36㎡ 大田山水源地		30㎡ 台町水源地		88㎡ 西田井浄水場		1,074㎡ 石法寺浄水場		254㎡ 高架水槽		118㎡ 京泉浄水場		228㎡ 久下田浄水場		49㎡ 三谷浄水場													

2. インフラ系公共施設の進捗について

インフラ系公共施設については、真岡市公共施設等総合管理計画で定めた基本目標や実施方針の達成に向けて、各種個別計画の策定などを進めています。

基本目標① 適正管理による計画的な整備・更新

- 実施方針 ◇点検・診断結果を活用したメンテナンスサイクルの構築
◇中長期的な視点によるバランスの取れた施設の整備・更新

基本目標② 長寿命化による安定供給及び将来負担の抑制

- 実施方針 ◇計画的な長寿命化の推進

表 3 インフラ系公共施設の進捗状況

施設類型	取組内容 (公共施設等 総合管理計画 より)	進捗状況 (令和 2 年 8 月末 時点)	個別計画の概要
道路	舗装長寿命化修繕計画の改定	平成 27 年度に策定した計画に基づき、修繕を進めている。 定期的な路面調査に基づき、計画の改定を行うが、時期は未定。	【計画名】舗装長寿命化修繕計画 【策定年度】平成 27 年 11 月 【計画期間】15 年間 【目的】舗装修繕は、これまでの損傷が大きくなってから補修を行う事後保全から、計画的に早い段階で予防的な補修を行う予防保全へ転換することにより、通行の安全確保と維持管理費の縮減及び平準化を図る。 【対象】市道のうち、MCI 値(舗装の維持管理指数)が 3.0 以下の路線約 47km 【実績】平成 28 年度実績 3.5km 平成 29 年度実績 1.6km 平成 30 年度実績 3.2km 令和元年度実績 3.3km 計 11.6 km ※MIC 値とは、舗装修繕の要否を判断する評価値で、3 以下は修繕が早急に必要であり、5 以上は不要な状態を表します。
橋梁	橋梁長寿命化修繕計画の改定	5 年毎の橋梁点検結果に基づき、計画の改定時期を検討していく予定 令和 3 年度実施計画に橋梁長寿命化修繕計画の改定予算を計上	【計画名】橋梁長寿命化修繕計画 【策定年月】平成 25 年 3 月 【計画期間】10 年間 【目的】橋梁修繕は、これまでの損傷が大きくなってから補修を行う事後保全から、計画的に早い段階で予防的な補修を行う予防保全へ転換することにより、安全確保と維持管理費の縮減及び平準化を図る。 【対象】市道に架かる 499 橋（真岡駅跨線橋及び下高間木歩道橋を含む）のうち、長さ 15m 以上の 32 橋 【実績】対象 32 橋のうち、補修を要する橋梁は 22 橋 平成 26 年度実績 1 橋 平成 27 年度実績 4 橋 平成 28 年度実績 3 橋 平成 29 年度実績 2 橋 平成 30 年度実績 2 橋 令和元年度実績 3 橋 計 15 橋

施設類型	取組内容 (公共施設等総合管理計画より)	進捗状況 (令和2年8月末時点)	個別計画の概要
上水道	水道事業長期更新計画の見直し	平成30年度に当該計画を見直し済み。 水道ビジョン(令和2年度策定予定)において取り組むべき事業を整理予定。	<p>【計画名】水道事業長期更新計画</p> <p>【策定年月】平成28年3月策定 平成31年3月見直し済み</p> <p>【計画期間】40年</p> <p>【見直しの概要】水道施設の更新等の投資について、ダウンサイジングによる経済性の確保及び耐震化等の安定供給機能の向上を図ることを目的とし、効率的、効果的に施設の再構築・更新を図る。</p> <p>【対象】石法寺浄水場他11施設及び管路 総延長約824Kmを含む水道設備全般</p>
	水安全計画の策定	令和元年度策定済み	<p>【計画名】水安全計画</p> <p>【策定年度】令和2年3月策定</p> <p>【概要】水源から供給水栓までの過程において、水質に関する危害や危害発生原因を分析し、安全な水の供給を確実にする水質管理体制の構築を図るための計画</p>
	水道ビジョンの策定	令和2年度策定予定	<p>【計画名】水道ビジョン</p> <p>【策定年度】令和2年度予定</p> <p>【概要】水道事業の現状と将来見通しを分析・評価したうえで目指すべき将来像を描き、「水道事業長期更新計画」「水安全計画」「耐震化計画」を包括的に実現させるためのマスタープラン(基本計画)</p>

施設類型	取組内容 (公共施設等総合管理計画より)	進捗状況 (令和2年8月末時点)	個別計画の概要
下水道	下水道ストックマネジメント計画の策定	<p>令和元年度にストックマネジメント計画（5カ年計画）を策定</p> <p>令和2年度以降に当該計画を基に下水道施設の修繕・改築を実施する。</p>	<p>【計画名】下水道ストックマネジメント計画</p> <p>【策定年月】平成31年3月</p> <p>【目的】長期的視点で公共下水道施設全体の今後の老朽化の進捗を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、施設点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化すること。</p> <p>【対象】水処理センター、二宮水処理センター、及び管路総延長約335Kmを含む下水道設備全般</p>
	農業集落排水処理施設全体の最適整備構想の策定	<p>平成30年3月策定済</p> <p>今後は、当該計画を基に農業集落排水処理施設の修繕・改築を実施していく予定。</p>	<p>【計画名】農業集落排水処理施設最適整備構想・再編整備計画</p> <p>【策定年月】平成30年3月</p> <p>【目的】長期的視点で農業集落排水処理施設全体の今後の老朽化の進捗を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、施設点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化すること。</p> <p>【対象】全11地区の農業集落排水処理場、及び管路総延長約133Kmを含む農業集落排水設備全般</p>
